


Status nødnettinnfasing

11X sentraler Møre og Romsdal

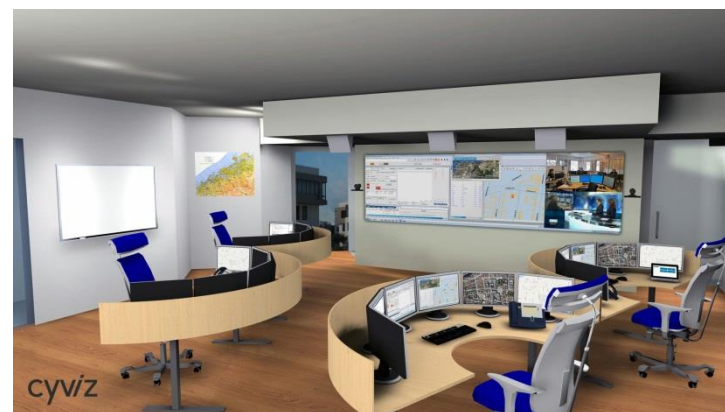

AMK MR

Nordmøre og Romsdal PD- Nødnett



- **Go live ICCS (telefoni) 18/9-2013**
- **Uke 40:** Instruktører/teknisk personale til Stavern for (re) opplæring før lokal instruksjon
- 11. september prosedyremøte 11X sentraler MR (Gjelder også Brann og Helse)
- **30. september:** forventet RFGLT (ready for go live tetra) i NRPD
- **Oktober:** Gjennomgang av Motorolas dekningskontroll i NRPD samt egen dekningskontroll.
- **Uke 42-48:** Lokal opplæring
- **3. desember:** Forventet Go live nødnett.



Sunnmøre PD- Nødnett




- Go live ICCS august 2013.
- Potensielt store på Sunnmøre, pga for få utbygde siter (basestasjoner)= dekningsutfordring
- Usikkert i dag når RFGLT. Kan bli utsatt til 2015
- Opprinnelig plan Sunnmøre PD:
 - Opplæring hele november
 - Go live 10. desember

Brann- 110 MR


- RFI gjennomført
- Nødstrøm, UPS og kjøling forventes installert medio oktober
- SAT (Site acceptance test) er uke 50
- Opplæring : Oppstart uke 2/2015. ca 180 pers.
- Opplæring ICCS operatører. Oppstart uke 7/2015
- Go live ICCS er uke 9/2015: Kun telefoni.
- Go live vision uke 19/2015. Tetra



Helse



- 27/8: Kick start prosedyremøte med kommuner
- Uke 39: RFI(Ready for installation) AMK MR
- Uke 49: Flytting fra gammel AMK Sunnmøre til nytt AMK bygg.
- UKE 2/2015: AMK MR i drift.
- Uke 9/2015: PAC dato AMK MR *(får overlevert nødnettinstallasjonen).*
- Mars/april 2015 opplæring
- Go live nødnett AMK MR mars/april 2015
- Go live AM/LVS 4 kvartal 2015



Noen ferske bilder fra nytt AMK bygg


Kontrollrom mot øst



Kontrollrom mot Vest



Oppsummert nødnett innfasing



Go live NRPD
Uke 49 2014

Go live
Brann/110 MR
Uke 9 2015

Go live SMPD?
Uke ?? 2015

Go live AMK MR
Mars/april 2015

NB! Antar at datoene fortsatt er bevegelige mål
